

施 設 名 東京都しごとセンター

- **工事概要**
本施設は、東京しごとセンターのほか、雇用・就業に関する様々な機関及び、共同住宅で構成されている複合的な施設である。
当該施設は、平成8年（1996年）のしゅん功から25年が経過しており、特に設備面の老朽化が著しく、事業の増加によりフロアレイアウトの見直しが必要である。このため、「第二次主要施設10か年維持更新計画」に基づき大規模改修工事を実施する。

工 事 場 所：東京都千代田区飯田橋三丁目10番3号



- **契約工期** 令和3年10月13日から令和7年2月28日まで

- **工事進捗状況**

- 1 **令和3年 10月**
工 事 工 程：工事着手前



- 2 **令和4年 1月**
工 事 工 程：工事着手前

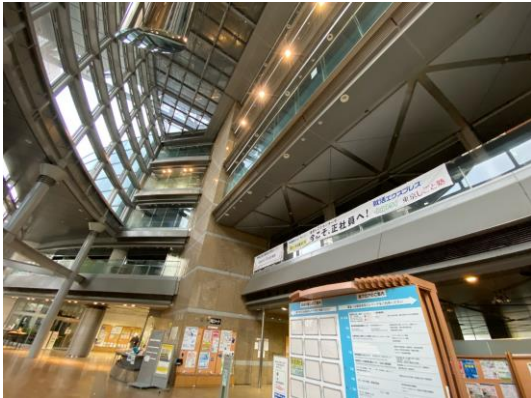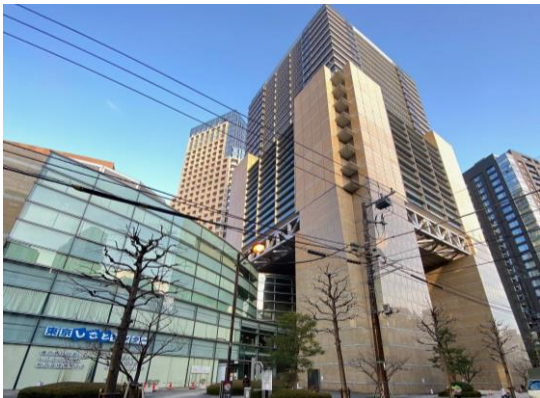

- 3 **令和4年 4月**
工 事 工 程：仮設工事中




4 令和4年 7月
工 事 工 程：仮設工事中




5 令和4年 10月
工 事 工 程：外壁工事中・内装工事中



6 令和5年 1月
工 事 工 程：内装工事中

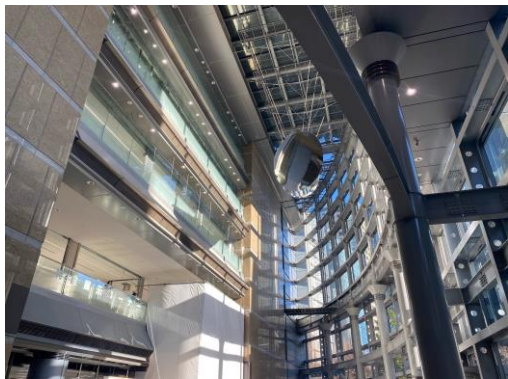


7 令和5年 4月
工 事 工 程：仮設工事中

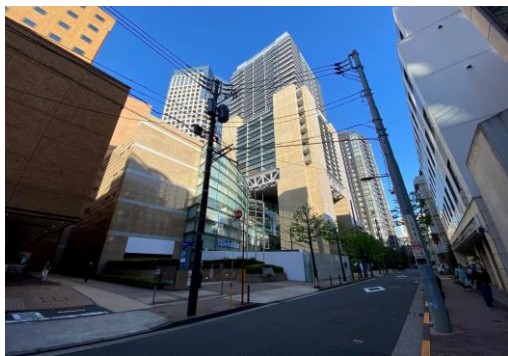


8 令和5年 7月

工 事 工 程：内外装改修工事中

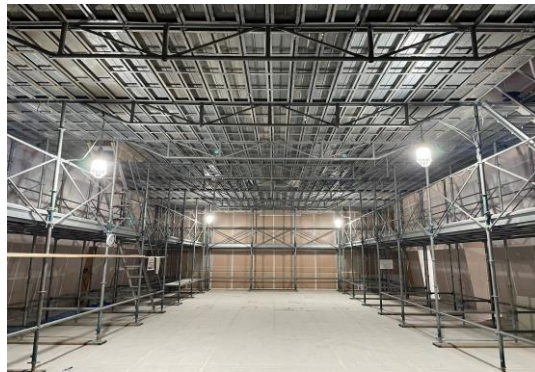



9 令和5年 11月

工 事 工 程：内外装改修工事中

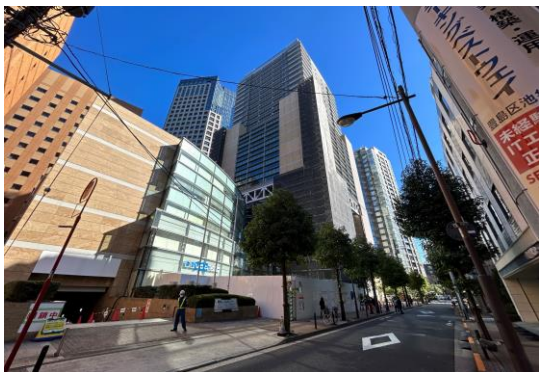


10 令和6年 2月

工 事 工 程：一部しゅん工

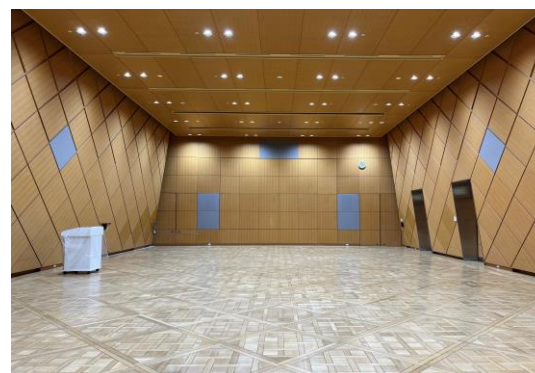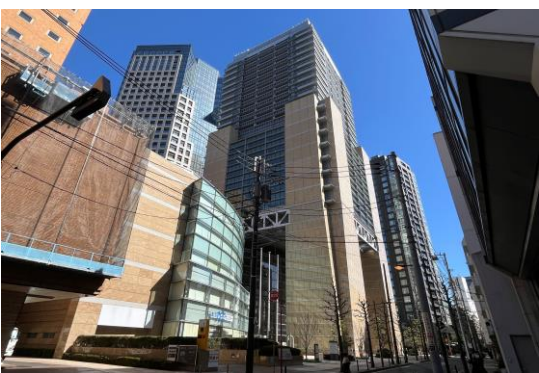

11 令和6年 11月

工 事 工 程：一部しゅん工

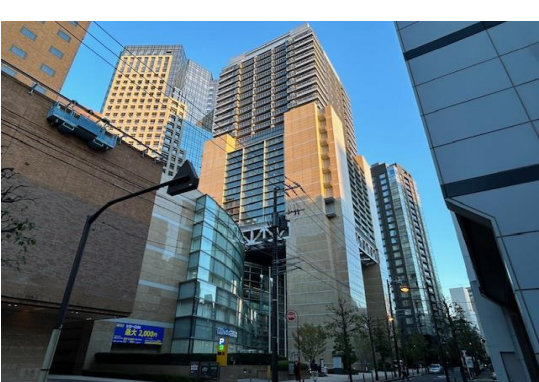

12 令和7年 5月

工 事 工 程：工事完了

