

施 設 名 社会福祉施設建替え促進用仮移転施設（仮称）

● 工事概要

都内の社会福祉施設は、老朽化のため建替えを必要とする施設が多いものの、敷地が狭隘であることや地価が著しく高いことなどにより、現地での建替えや仮移転用地の確保が困難な状況にある。このため、都が代替施設を整備し建替え期間中の事業者に貸し付けることによって、老朽化した特別養護老人ホームの建替えを推進し、福祉サービスの質の担保、一層の向上を図るものである。

なお、本件は「板橋キャンパス跡地活用プラン」（平成31年2月）に基づき整備を行うものである。

工 事 場 所：東京都板橋区栄町35番2号

● 契約工期 令和5年3月3日から令和7年11月28日まで

● 工事進捗状況

1 令和5年 4月

工 事 工 程：準備工（現場調査中）



2 令和5年 7月

工 事 工 程：土工事中（敷地造成中）



3 令和5年 11月

工 事 工 程：杭工事中



4 令和6年 2月

工 事 工 程：基礎工事中




5 令和6年 11月

工 事 工 程：躯体工事中



6 令和7年 5月

工 事 工 程：仕上工事中

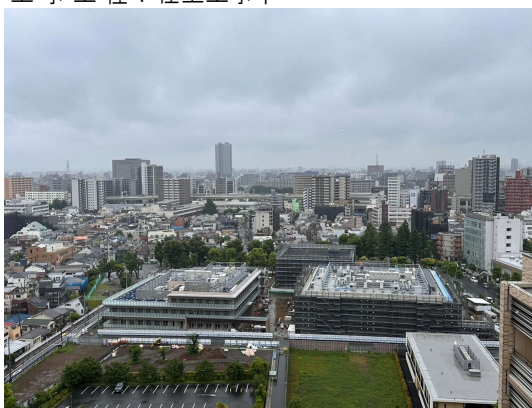

7 令和7年 8月

工 事 工 程：仕上工事中



8 令和7年 11月

工 事 工 程：工事完了

